

Absichtserklärung «Gesamtkonzept Bahnhof Münsingen»

zwischen

Gemeinde Münsingen, Neue Bahnhofstrasse 4, 3110 Münsingen
(nachfolgend Gemeinde Münsingen)
vertreten durch
Beat Moser, Gemeindepräsident
Thomas Krebs, Gemeindeschreiber

und

Schweizerische Bundesbahnen SBB, spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern,
vertreten durch Division Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektorganisation
Ausbau Knoten Bern, Bahnhofstrasse 12, 4600 Olten
(nachfolgend SBB)
vertreten durch
Maren Königs, Gesamtprojektleiterin Münsingen

Präambel

Der Bahnhofraum Münsingen spielt eine zentrale Rolle für die Mobilität und die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Münsingen und ist ein wichtiges Projekt der SBB im Rahmen des Ausbaus Schrittes 2025 (STEP AS 2025). Die Gemeinde sowie die SBB erkennen die Notwendigkeit einer koordinierten Planung in diesem Bereich.

Ziel ist es, ein gemeinsam getragenes «Gesamtkonzept Bahnhof Münsingen» (Gesamtkonzept) zu erarbeiten, das als Grundlage für künftige Planungen und Investitionen dient.

1. Ziel und Zweck

Die vorliegende Absichtserklärung bezweckt die gemeinsame Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für das Bahnhofsareal. Dieses soll städtebauliche, verkehrliche und funktionale, aber auch freiräumliche und sozialräumliche Aspekte berücksichtigen und eine integrierte Entwicklung des Bahnhofareals und der Gemeinde ermöglichen.

Die Absichtserklärung ist rechtlich nicht verbindlich, bringt jedoch den gemeinsamen Willen der beiden Partner zum Ausdruck, das Projekt aktiv voranzutreiben und auf partnerschaftlicher Basis zusammenzuarbeiten.

2. Inhalte des «Gesamtkonzepts Bahnhof Münsingen»

Als Referenz für das «Gesamtkonzept» dient das aktuell vorliegende Vorprojekt SBB «AS25 Münsingen, Wendegleis». Die Gleisgeometrie und Perron Anlagen bilden fixe Grundlagen. Das „Gesamtkonzept“ soll insbesondere folgende Punkte behandeln:

- Optimierung der Personenunterführungen bzw. Analyse der Querungsfunktion (PU Nord, PU Mitte, PU Süd)
- Potenzial zusätzlicher Bahnzugänge (z. B. ab Schlossstrasse)
- Überprüfung der Zugänge für den Fuss- und Veloverkehr Zugang West PU Mitte (inkl. Zugang aus PU Mitte zum Perron West)
- Machbarkeit Bahnzugänge PU Mitte Ost- und Mittelperron mit Liften
- Überprüfung Zugang Ost der PU Süd in Zusammenhang mit dem Güterschuppen
- Ausmass des Bushofs inkl. der Frage der Erweiterung im Zusammenhang mit dem Güterschuppen
- Umgang mit dem Güterschuppen (inkl. Verschiebung oder Rückbau)

- Gestaltung und Funktionalitäten des Bahnhofplatz Ost
- Standorte und Umfang der Veloabstellplätze bei den Bahnzugängen
- Standortwahl für das Bahntechnikgebäude (inkl. Variantenvergleich) und der P&R Fläche im südöstlichen Perimeter

3. Zusammenarbeit

Die Gemeinde Münsingen und die SBB verpflichten sich zur engen Zusammenarbeit während des gesamten Prozesses der Erarbeitung des «Gesamtkonzepts» basierend auf der gemeinsam erarbeiteten «Synthese Bedürfnisanalyse von SBB und der Gemeinde Münsingen – Grundlage für Gesamtkonzept» (Siehe Anhang).

Es wird eine gemeinsame Projektorganisation (Arbeitsgruppe für inhaltliche Erarbeitung und Strategische Gruppe für strategische Entscheide) mit klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten geschaffen. Entscheide innerhalb des Projektverlaufs werden gemeinsam und wo notwendig unter Einbezug des BAV gefällt.

4. Finanzierung

Die Kosten für das «Gesamtkonzept» werden von der SBB getragen. Eigenleistungen der Gemeinde Münsingen trägt die Gemeinde Münsingen selber.

5. Koordination & Kommunikation

Die Koordination für die Erarbeitung des «Gesamtkonzeptes Bahnhof Münsingen» erfolgt durch die Metron Bern AG. Die Kommunikation gegen aussen erfolgt durch die Parteien koordiniert und in gegenseitiger Abstimmung. Ziel ist eine transparente Information der Bevölkerung und der relevanten Anspruchsgruppen.

6. Inkrafttreten und Dauer

Diese Absichtserklärung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und gilt bis zum Abschluss des «Gesamtkonzepts Bahnhof Münsingen» oder bis auf Widerruf. Der geplante Abschluss des Projektes ist im Januar 2026.

Gemeinde Münsingen

Beat Moser, Gemeindepräsident

Thomas Krebs, Gemeindeschreiber

Ort, Datum: Münsingen, 16. Juni 2025

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Maren Königs, Gesamtprojektleiterin

Ort, Datum: Bern, 06. Juni 2025

Gesamtkonzept Bahnhof Münsingen

Synthese Bedürfnisanalyse von SBB und der Gemeinde Münsingen

Stand: 13.05.2025

Für die Bearbeitung von Lösungsmöglichkeiten für die verschiedenen Bereiche im Raum Bahnhof Münsingen werden folgende Grundlagen erarbeitet:

- Analysen zu den Themen Städtebau und Sozialraum, Freiraum sowie Mobilität
- Erhebung der Bahnquerungen bei allen Unterführungen (Abb.1)

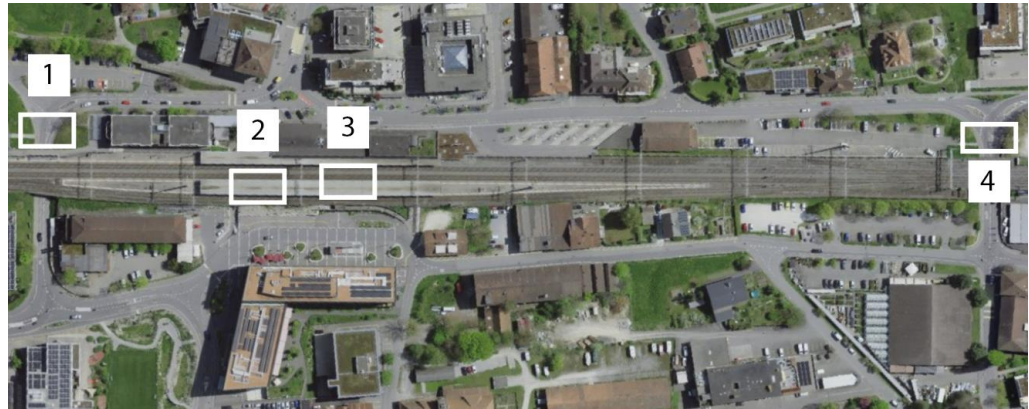


Abbildung 1 Erhebungsperimeter Standorte 1-4

Standort 1: Unterführung Schlosstrasse

Standort 2: Unterführung Nord

Standort 3: Unterführung Mitte

Standort 4: Unterführung Belpbergstrasse

Nachfolgend wird eine Synthese der Bedürfnisse der Gemeinde Münsingen und der SBB vorgeschlagen. Diese wurden im Rahmen der Bedürfnisanalysen, die jeweils separat mit der Gemeinde Münsingen und der SBB durchgeführt wurden, ermittelt. Weiter wird aufgezeigt, welche Arbeitsschritte für die Erarbeitung des Gesamtkonzeptes als Nächstes anstehen.

1. Unterführung Schlosstrasse

- **Gemeinsamkeiten:** Beide Parteien erkennen das Potenzial für einen zusätzlichen Gleiszugang über die Schlosstrasse.
 - **Unterschiede:** Die Gemeinde betont die Defizite für den Fuss- und Veloverkehr, das Defizit bei der lichten Durchfahrtshöhe, die Abplatzungen an der Decke sowie mögliche Synergien mit der ZPP Baufeld 1. Gemäss SBB ist die SU Schlosstrasse in einem guten Zustand. Die SBB fokussiert auf eine mögliche Entlastung der PU Mitte und stellt Eigentumsfragen (es gibt keinen offiziellen Bauwerksvertrag für die SU Schlosstrasse) in den Vordergrund.
- ➔ **Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie**
- Machbarkeitsstudie betreffend Bahnzugang ab Unterführung Schlosstrasse
 - Evaluation von verschiedenen Lösungen und deren Auswirkungen (z.B. ab Niveau Schlosstrasse oder ab erhöhtem FG-Niveau)

- Aufzeigen der Auswirkungen einer Bahnanbindung der Schlossstrasse
→ Gesamtsicht aller Bahnquerungen, Betrachtung in verschiedenen Horizonten - AS25 oder langfristig (Aufwärtskompatibilität)

2. Personenunterführung Nord

- **Gemeinsamkeiten:** Konsens über Wert der Wegeverbindung und Offenheit für Aufhebung bei adäquatem Ersatz.
- **Unterschiede:** Gemeinde wünscht eine sichere und ausreichende Fussgänger- und Veloverbindung im Norden. Die SBB würde die PU-Nord wegen ungenügender Dimensionierung und ungünstiger Höhenlage gerne zurückbauen. Der Ersatz muss aus Sicht SBB nicht zwingend an der Schlossstrasse liegen.

Begründung Gemeinde: Das Hauptanliegen der Gemeinde sind valable Querungsmöglichkeit für Fuss- und Veloverkehr, es geht nicht per se um das Bauwerk, sondern um gute Wegverbindungen und einen guten Gleiszugang. Zudem sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Zufussgehenden und Velofahrenden berücksichtigt werden und auch die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, welche die Bahnlinie einfach nur queren müssen, ohne mit dem Bahnverkehr in Kontakt zu kommen.

Begründung SBB: Für die SBB steht der Wunsch nach Rückbau (Risikominimierung) im Vordergrund. Der Grund ist, dass die Dimensionierung für Durchgang und Perronzugang nicht ausreichend ist und die PU auch nicht behindertengerecht ausgeführt werden könnte.

→ Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie

- Aufzeigen der Auswirkungen einer Bahnanbindung der Schlossstrasse
→ Gesamtsicht aller Bahnquerungen, Betrachtung in verschiedenen Horizonten - AS25 oder langfristig (Aufwärtskompatibilität)

3. Personenunterführung Mitte

- **Gemeinsamkeiten:** Gute Zugänge, Barrierefreiheit und gute Anbindung der Velostation Senevita (Westseite) sind beiden wichtig. Realisierung während laufendem Betrieb wird als Herausforderung erkannt.
- **Unterschiede Ostseite:** Der Gemeinde ist wichtig, im Zusammenhang mit dem Bahnzugang auch die Situation vor dem Bahnhof (Kiss & Ride, Taxiplätze) zu verbessern und wegfallende Veloabstellplätze an optimaler Lage zu ersetzen. Die SBB hat den Fokus auf einem möglichst guten Bahnzugang und denkmalpflegerisch verträglichen Eingriffen am Aufnahmegebäude.
- **Unterschiede Westseite:** Der Gemeinde möchte die Zugänge zur Velostation von beiden Seiten (Süd und Nord) in Koexistenz. Die Normen der SBB verunmöglichen dies im aktuellen Projekt.

Begründung Ostseite: Im Osten soll ein adäquater Ersatz für die wegfallenden Veloabstellplätze geschaffen werden, da der Bahnhof auch von Osten mit dem Velo angefahren wird.

Begründung Westseite: Für die Gemeinde soll der Zugang zur Velostation von Nord- und Südseite (in Koexistenz) möglich sein. Der Zugang hat allerdings nichts mit der Querung zu tun. Die PU Mitte soll nicht mit dem Velo durchfahren werden.

Der Gemeinde ist es wichtig, dass die Konfliktstelle bei der Treppe zum Perron mit der Zufahrt zur Veloeinstellhalle (gemäss Vorprojekt AS25) behoben bzw. gelöst wird.

→ **Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie**

- Alternative Varianten zur heutigen Lage prüfen (verschieben Unterführung)
- Optimierung Westzugang für Fuss- und Veloverkehr
- Bahnzugänge PU Mitte (alle Perrons) mit Liften prüfen, Machbarkeit überprüfen
- Evaluation der Bestvariante Bahnhofszugänge
→ Gesamtsicht aller Bahnquerungen, Betrachtung in verschiedenen Horizonten - AS25 oder langfristig (Aufwärtskompatibilität)

4. Ostseite des Bahnhofs / Bahnhofplatz

- **Gemeinsamkeiten:** Beide streben eine Aufwertung zu einem attraktiven Ankunftsort an.
 - **Unterschiede:** Die Gemeinde betont Wichtigkeit von Entsiegelung, Begrünung und Einbettung in bauliche Entwicklung. Die SBB ist fokussiert auf Funktionalität für Bahnreisende.
- **Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie**
- Erarbeitung Stossrichtungen und Gesamtkonzept unter Einbezug der Resultate der einzelnen Analysen.

5. Bushof

- **Gemeinsamkeiten:** Beide erkennen Notwendigkeit zur Erweiterung und einer erhöhten Aufenthaltsqualität (bspw. Überdachung).
- **Unterschiede:** Gemeinde fordert Konzentration aller Buskanten auf der Ostseite, da sie der Auffassung ist, dass dies aus Nutzersicht und für die Schaffung eines regionalen Hubs attraktiver ist. Die SBB favorisiert eine Aufteilung der Buskanten und teilweise Anordnung auf der Westseite → Verteilung Verkehrsströme, Spielraum auf der Ostseite, Erhalt des Güterschuppen.

Begründung der Gemeinde: Für die Gemeinde war auf der Westseite des Bahnhofs bisher nie eine Busstation vorgesehen und auch nicht im bereits abgeschlossenen Workshopverfahren enthalten. Die Gemeinde sieht keine Möglichkeit, auf der Westseite den Raum zur Verfügung zu stellen. Das ganze System würde in Frage gestellt. Vor dem Gebäude Senevita besteht eine Fahrbahnhaltestelle für alle durchfahrenden Buslinien.

Die Gemeinde hat einen Auftrag aus dem Parlament den Bushof zu überdachen. Beim Thema Überdachung ist aber wichtig, dass auch Klimamassnahmen wie bspw. Begrünung mitgedacht werden. Es geht v.a. um Aufenthaltsqualität und unter dieser Betrachtungsweise muss eine Abwägung gemacht werden, ob Dach und/oder Baum erstellt werden sollen.

→ **Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie (in Koordination mit Bushof, Rampe PU Süd)**

- Überprüfung Buskonzept (inkl. Nachweis der Notwendigkeit Anzahl Buskanten) → Input für Interessensabwägung Güterschuppen
- Evaluation Bausubstanz und städtebauliche Funktion Güterschuppen → Zusammenhang Güterschuppen
- Optimierung Zugang Ost zur PU-Süd in Abhängigkeit zum Güterschuppen und allen anderen relevanten Rahmenbedingungen → Zusammenhang Optimierung Unterführungen

6. Güterschuppen

- **Gemeinsamkeiten:** Beide Parteien erkennen Flächenbedarf im Zusammenhang mit dem Bushof und dem Bahnzugang zur PU Süd.
- **Unterschiede:** Gemeinde fordert Abbruch oder Verschiebung. SBB will Erhalt und mögliche Umnutzung, lehnt Lageveränderung unter aktuellen Voraussetzungen ab.

Begründung: Für die Gemeinde ist es wichtig, dass der nötige Spielraum vorhanden ist für die Erweiterung des Bushofs und eine gute Lösung PU Süd (Zugang). Aus Sicht der Gemeinde ist dies aktuell bei einem Erhalt des Güterschuppens nicht gegeben. Für die SBB auf der anderen Seite reicht der Erweiterungsgrund Bushof nicht als Argument, um den Güterschuppen abzureisen oder zu versetzen. Aus Sicht der SBB ist es auch denkbar, dass sich die Interessen hinsichtlich der Erweiterung des Bushofs und des Zugangs zur PU Süd mit dem Erhalt des Güterschuppens vereinbaren lassen. Es braucht in jedem Fall eine ausführliche und vollständige Interessensabwägung.

→ **Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie (in Koordination mit Bushof, Rampe PU Süd)**

- Evaluation Bausubstanz und städtebauliche Funktion Güterschuppen
- Optimierung Zugang Ost zur PU-Süd in Abhängigkeit zum Güterschuppen und allen anderen relevanten Rahmenbedingungen → Zusammenhang Optimierung Unterführungen
- Überprüfung Buskonzept (inkl. Nachweis der Notwendigkeit Anzahl Buskanten) → Zusammenhang Bushof
- Erneute Interessensabwägung im Zuge des Gesamtkonzeptes: Erhalt, Verschiebung, Rückbau Güterschuppen

7. Personenunterführung Süd

- **Gemeinsamkeiten:** PU Süd ist für beide Seiten von Bedeutung. Einbindung in Rahmenwerk Bahnhof West wird gewünscht.
- **Unterschiede:** Für die Gemeinde ist die PU-Süd auch eine wichtige Veloverbindung, deshalb müssen die Velorampen direkt und gut ans Velonetz angeschlossen werden. Für die SBB hat die zusätzliche Bahnanbindung für Zufussgehende und deren Sicherheit oberste Priorität.

→ **Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie**

- Optimierung Zugang Ost zur PU-Süd (in Abhängigkeit zum Güterschuppen) → Entschärfung Konfliktpunkt P+R Zugang / Bushofzufahrt / Fuss- und

Veloverkehr. Es wird skizziert, wie die unterschiedlichen städtebaulichen Varianten die Nutzung des Güterschuppens ermöglichen oder verhindern.

→ Input für Interessensabwägung

- Anbindung auf der Westseite auf Basis des Richtprojekts Bahnhof West unter Berücksichtigung Entwässerung SBB (Retentionsbecken auf altem Jumbo Gelände)

8. Park & Ride / Bahntechnikgebäude

- **Gemeinsamkeiten:** Beide Seiten offen für Reduktion der PP und alternative Standorte für das Bahntechnikgebäude. Begrünung und flexible Nutzung des Bereichs sind ebenfalls gemeinsame Themen.
- **Unterschiede:** Die Gemeinde bevorzugt eine weniger präzise Lage des BTG. Für die SBB ist der heutige Zugang zum P+R bezüglich Sicherheit nicht optimal.

→ Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie

- Evaluation Standort Bahntechnikgebäude
 - Ergänzung bestehendes Faktenblatt mit zusätzlichen Standorten
 - Städtebauliche Potenziale und Spielräume, die sich durch eine Verschiebung des BTG ergeben, werden skizziert.
- Erarbeitung Stossrichtungen und Gesamtkonzept unter Einbezug der Resultate der einzelnen Analysen

9. Weitere Fragen / Inputs

- **Gemeinsamkeiten:** Der Einbezug der Bevölkerung ist für Gemeinde Münsingen und SBB wichtig. Seitens der Gemeinde ist die Abstimmung mit der Kommunikation zum Vorhaben Bahnhof West nötig.
- **Unterschiede:** Der Gemeinde ist es zudem ein grosses Anliegen, dass die Velohaupttrouten im Bahnhofraum angemessen im Gesamtkonzept berücksichtigt werden.

→ Bearbeitung im Rahmen Gesamtstudie

- Erarbeitung Stossrichtungen und Gesamtkonzept unter Einbezug der Resultate der einzelnen Analysen
- Echoraum in Phase 3
- Öffentlichkeitsarbeit Phase 4

Übersicht Synthese Bedürfnisanalyse von SBB und der Gemeinde Münsingen

