

Vertrag Nr.: 90052877

Bahnhof: Emmenbrücke / Fluhmühle
Gemeinde: Ebikon
Linie Nr./km: Linie 500 / km 90.550
Linie 660 / km 62.700



Vereinbarung

zwischen

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten

(nachfolgend «SBB AG»)

und

der Schweizerischen Eidgenossenschaft

vertreten durch das Bundesamt für Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur
Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen

(nachfolgend «ASTRA»)

betreffend

Rückbau SBB 15kV Speiseleitung UW Emmenbrücke – SP Ebikon

(nachfolgend «das Bauwerk»)

A. Einleitung

1. Ausgangslage

Der Kapazitätsausbau der Nationalstrasse N02 soll die Stadt Luzern entlasten, indem die Stadtautobahn (heute Cityring) den lokalen MIV aufnimmt, während der Transitverkehr den neuen Bypasstunnel zwischen der Verzweigung Rotsee und Kriens benutzt. Während der rund 10 Jahre dauernden Bauphase muss im Bereich der 15kV Leitungsquerung zwischen den Masten Nr. 1, 1A und 2 wiederholt mit grossen (d.h. hohen) Geräten gearbeitet werden können.

Ein Belassen der 15kV Bahnstromleitung «Sedel» mit punktuellen Abschaltungen zum Zeitpunkt der Bauausführung stellt eine zu starke Einschränkung für den Bauablauf dar, der in sich bereits hoch komplex ist. Gemessen am Umfang des Nationalstrassenprojekts sind solche Einschränkungen im Bauablauf nicht verhältnismässig.

Nach eingehenden Beratungen zwischen dem ASTRA und der SBB wurde schliesslich beschlossen, die 15kV-Bahnstromleitung vom Unterwerk (UW) Emmenbrücke bis zum Schaltposten (SP) Ebikon vollständig zurückzubauen. Dies ist dank einer optimierten 15kV-Netzkonfiguration seitens SBB durch den neuen Leistungsschaltposten Luzern möglich. Diese Lösung gewährleistet eine reibungslose Umsetzung des ASTRA-Projekts "Bypass Luzern".

2. Ziele und Zweck der Vereinbarung


Die vorliegende Vereinbarung regelt die Modalitäten der Zusammenarbeit, die Rechte und Pflichten der SBB AG und des ASTRA in Bezug auf den Rückbau des Bauwerkes sowie die Verteilung der Investitionskosten unter den Parteien.

3. Gegenstand der Vereinbarung und Beschreibung des Bauwerks

3.1. Folgende Bauwerke und Anlagen sind Gegenstand dieser Vereinbarung:

- SBB 15kV Speiseleitung UW Emmenbrücke – SP Ebikon

3.2. Das betroffene Bauwerk, welches rückgebaut werden soll, ist auf dem nachfolgenden Situationsplan in roter Farbe dargestellt. Die Punkte stellen Masten dar, welche ebenfalls zurückgebaut werden. Ausgenommen sind die Masten 104 und 107, welche nicht abgebaut und weitergenutzt werden.

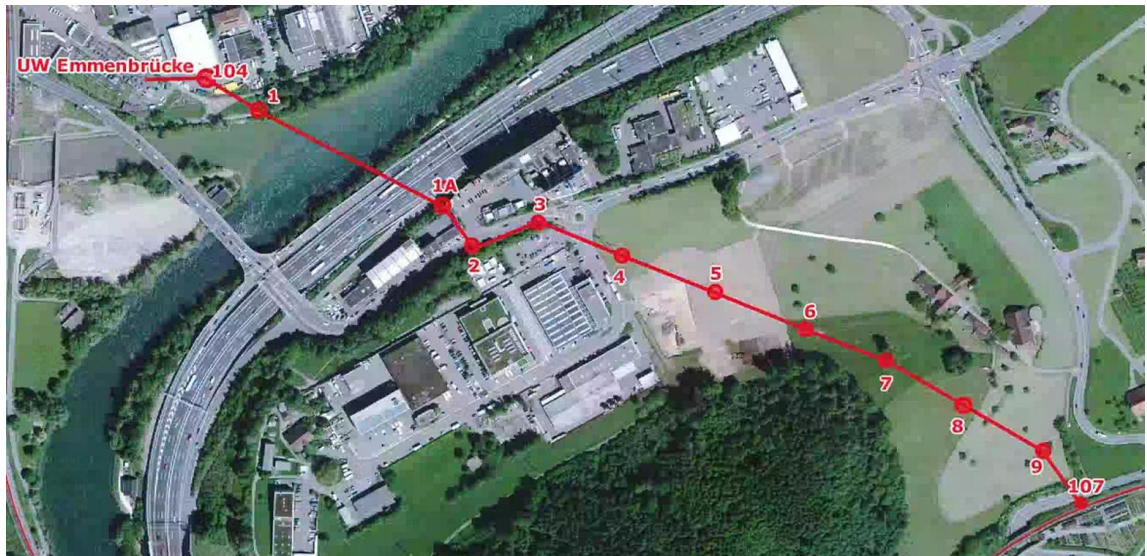

4. Bestandteile der Vereinbarung und deren Rangordnung

4.1. Die vorliegende Vereinbarung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- Vertragsurkunde
- Technischer Bericht, Version 1.3 vom 23.06.2025 (Beilage 1)

Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vertragsbestandteilen hat das vorliegende Vertragsdokument Vorrang.

B. Eigentum

5. Eigentum am Bauwerk

- 5.1. Die SBB AG ist gegenwärtig Eigentümerin des Bauwerkes, welches rückgebaut wird. Mit Vollendung der Rückbauarbeiten erlischt das Eigentum.
- 5.2. Die SBB AG bleibt unverändert Eigentümerin ihrer gesamten Bahn- und Energieanlagen im Projektperimeter, welche von den Arbeiten nicht betroffen sind.
- 5.3. Vorbehältlich einer anderen ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien werden die in diesem Artikel definierten Eigentumsrechte nicht Gegenstand von Eintragungen im Grundbuch sein.

6. Grundeigentum und Rechte

- 6.1. Die Grundstücksgrenzen und Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden bleiben unverändert.

C. Durchführung der Rückbauarbeiten

7. Bauherrschaft

Die SBB AG übernimmt die Bauherrschaft.

8. Projekt- und Bauleitung

- 8.1. Die Projektleitung und die örtliche Bauleitung werden der SBB AG übertragen. Die Oberbauleitung wird durch die SBB AG ausgeübt. Die SBB AG koordiniert in jedem Falle die bahnseitigen Leistungen und ist für die Sicherheit des Bahnbetriebs zuständig.

9. Projektgrundlagen

- 9.1. Die Ausschreibung und Realisierung basieren auf dem technischen Bericht, Version 1.3 vom 23.06.2025.
- 9.2. Die Ausschreibung und Realisierung richtet sich nach den geltenden Gesetzen, Normen und Vorschriften sowie den allgemein anerkannten Regeln der Baukunde und – soweit bahntechnische Anlagen betroffen sind – den für die Realisierung des Bauwerks relevanten Vorschriften und des Regelwerks der SBB (Reglemente, Weisungen und Richtlinien). Insbesondere wird auf die Ausführungs- und Qualitätsvorschriften für Ingenieurbauwerke verwiesen.
- 9.3. Bei Widersprüchen zwischen dem SBB-Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.

10. Genehmigungen und Zustimmungen

- 10.1. Das Projekt und die Realisierung des Bauwerks wurden vom BAV mit Verfügung vom 22.02.2024 bewilligt. Darin bewilligt wurde jedoch nur ein Teil des Leitungsabbruchs. Da die Stilllegung jedoch bewilligt wurde, ist der weitergehende Abbruch nicht mehr plangenehmigungspflichtig (vgl. Ziff. 6.3, Beilage 1). Auch eine kommunale Baubewilligung ist nicht erforderlich. Die Bauherrschaft ist jedoch angehalten, der Gemeinde Ebikon und der Stadt Luzern 20 Tage vor Beginn der Arbeiten eine Abbruchsanzeige zukommen zu lassen. Gegen die Verfügung vom 22.04.2024 ist zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein Rechtsmittelverfahren hängig.

11. Zeitplan für die Durchführung der Arbeiten

- 11.1. Die Ausführung ist vorbehältlich rechtsgültiger PGV Nationalstrassenprojekt Bypass Luzern für das Jahr 2027 geplant. Der nachfolgende Terminplan aus dem technischen Bericht vom 23.06.2024 (Beilage 1, Ziff. 9) zeigt den geplanten Ablauf auf.

Vergabe, Ausführung	Meilenstein	2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kreditfreigabe vom ASTRA	x						x																		
Ausschreibung / Offertanfrage																									
Bereinigung Offerten / Offertvergleich																									
Vergabe	x																								
Abbruchmeldung an Gemeinde Ebikon und Stadt Luzern																									
Vorbereitungszeit Unternehmer																									
Ausführung																									
Ausserbetriebnahme Speiseleitung durch SBB: Intervalle / Ressource VU SBB eingeplant	x																								
Rückbau Seile																									
Rückbau Masten, Fundamente (abhängig von Witterungsbedingung / Nässe von Boden)																									
Masten 5, 6 inkl. Fundamente rückgebaut	x																								
Rückbau Steuerkabel, Druckstütze M107																									

- 11.2. Diese Arbeiten erfordern die Stilllegung der betroffenen Leitung. Dies erfolgt bereits im September 2026. Die Rückbauarbeiten (Leiterseil Rückzug) im Bereich der Nationalstrasse N02 können nur in Nachtarbeit erfolgen, dabei muss die Nationalstrasse N02 zeitweise gesperrt werden. Die diesbezüglichen Massnahmen trifft das ASTRA. Die SBB AG reicht das Detailprogramm mit Sperranträgen min. 3 Monate vor der Ausführung über die «Projektleitung BSA BYLU» an das ASTRA ein.

12. Bauwerksdokumentation

Nach Abschluss der Bauarbeiten bewahrt die SBB AG ein Exemplar der Dokumentation des ausgeführten Werkes auf.

D. Finanzierung der Investitionskosten

13. Aufteilung der Investitionskosten

- 13.1. Die gesamten Investitionskosten für die Durchführung der Arbeiten in Bezug auf den Rückbau des Bauwerks, einschliesslich derjenigen für die Ausschreibung, Planung und die Bauleitung, werden auf CHF 461'500.– geschätzt (Genauigkeitsgrad von +/-10%, exkl. Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten, exkl. MWST, Preisbasis 03/2024) gemäss Kostenschätzung im technischen Bericht (siehe Beilage 1, Ziff. 15) und vom ASTRA getragen.
- 13.2. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung erfolgt seitens ASTRA die Freigabe für die Finanzierung der Dienstleistungsaktivitäten (Honorare) gemäss der nachfolgenden Gesamtkostenaufstellung. Die Kosten für die Dienstleistungen werden auf CHF 45'000.– geschätzt (Genauigkeitsgrad von +/-10%, exkl. Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten, exkl. MWST, Preisbasis 03/2024).
- 13.3. Die Freigabe für die Finanzierung der Ausführungsaktivitäten nimmt das ASTRA nach Eintritt der Rechtskraft der PGV vor. Die Kosten für die Ausführungsaktivitäten werden auf CHF 416'500 geschätzt (Genauigkeitsgrad von +/-10%, exkl. Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten, exkl. MWST, Preisbasis 03/2024).

Dienstleistungsaktivitäten (Freigabe nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung)		CHF
Honorar SIA Phase 41 Teil 1 (SBB): Erstellung Ausschreibungsunterlagen		5'000
Honorar SIA Phase 41 Teil 1 (Planer AFRY): Erstellung Ausschreibungsunterlagen		40'000
Zwischentotal		45'000
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten SBB (VVGK)	2%	900
Total (exkl. 8.1% MwSt)		45'900
Ausführungsaktivitäten (Freigabe nach Rechtskraft PGV)		
Honorar SIA Phase 41 Teil 2 (SBB): Durchführung Submissionen inkl. Vergaben und Begleitung Phasen 51-53		84'000
Honorar SIA Phase 41 Teil 2 (Planer AFRY): Durchführung Submissionen inkl. Vergaben und Bauleitung Phase 51 bis 53		39'000
Umwelt, Bodenbeprobung, Entsorgung		8'500
Entschädigung Landbeanspruchung		5'000
Demontage bei FL-Mast 107 / Unterwerk Emmenbrücke / Rückbau Steuerkabel Schalter F1E (VU-SBB)		88'000
Einbau Baupiste und Installationsplatz		60'000
Demontage Seile + Isolatorenketten (Inkl. Entsorgung) ¹		42'000
Demontage Tragwerke (Kran / Transport / Entsorgung): Masten 104 – 6 inkl., 107 (8 Stück)		19'637
Demontage Tragwerke (Kran / Transport / Entsorgung): Masten 7 – 9 (3 Stück)		7'363*
Rückbau Fundamente (Inkl. Entsorgung + Instandstellung Gelände): Masten 1 – 6 inkl., Druckstütze 107 (8 Stück)		32'727
Rückbau Fundamente (Inkl. Entsorgung + Instandstellung Gelände): Masten 7 – 9 (3 Stück)		12'273*
Zuschlag für Nachtarbeit (Reuss + N02)		13'000
Zuschlag Koordination N02 + Kantonstrasse		5'000
Zwischentotal		416'500
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten SBB (VVGK)	2%	8'330
Total (exkl. 8.1% MwSt)		424'830
Gesamttotal		461'500
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten SBB (VVGK)	2%	9'230
Total (exkl. 8.1% MwSt)		470'730

¹ Die Demontage der Seile muss ab Abfanggerüst Unterwerk bis zum Mast 107 komplett gemacht werden. Ein Teilabbruch ab Unterwerk nur bis zum Mast 7 käme schlussendlich teurer, weil in diesem Fall ein zusätzliches Ankerfundament mit Ankerseil erstellt werden müsste. Für ein solches Ankerfundament fehlt zudem ein Einverständnis des betroffenen Grundeigentümers.

- 13.4. Die Kostentragungspflicht des ASTRA gilt für Mehr- oder Minderkosten, welche die Schwankungsbreite von +/-10% über-/unterschreiten. Die SBB AG verpflichtet sich, das ASTRA bei einer sich abzeichnenden Kostenüberschreitung unverzüglich schriftlich über jede Situation zu informieren, welche auf einen Mehraufwand hindeutet und die Abweichung zu begründen.

14. Rechnungsstellung, Zahlungsfristen

- 14.1. Die Kosten werden nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt. Die Leistungen der SBB AG werden nach Leistungsfortschritt, zu den Herstellkosten zuzüglich Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (nach dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz abgerechnet; aktueller Satz 2%). Auf den so ermittelten Betrag wird die MWST aufgeschlagen (nach dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz abgerechnet; aktueller Satz 8.1%). Nebenkosten und laufende Ausgaben sind in den Rechnungen für die Leistungen enthalten.
- 14.2. Leistungen, die von der SBB AG an Dritte vergeben werden, werden nach Leistungsfortschritt zuzüglich Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (nach dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz abgerechnet; aktueller Satz 2%). Auf den so ermittelten Betrag wird die MWST aufgeschlagen (nach dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz abgerechnet; aktueller Satz 8.1%).
- 14.3. Das ASTRA zahlt den Betrag gegen Vorlage einer Rechnung welche wie folgt einzureichen sind:

Die Rechnung (PDF-Format) ist zusammen mit dem ausgefüllten Rechnungsdeckblatt (Excel-Format) in einfacher Ausführung per Mail einzureichen an:

controlling@planing.ch

Rechnungsanschrift:

Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs fonds (NAF)

c/o DLZ FI

CH-3003 Bern

Das "Merkblatt Fakturierung mit Rechnungsdeckblatt" bestimmt die Inhalte und das Format der Rechnung. Das ASTRA akzeptiert nur Rechnungen, welche diesen Mindestanforderungen entsprechen. Das Merkblatt kann über folgenden Link bezogen werden:

<https://dokumentengenerator.astra.admin.ch>

Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gemäss Art. 144 Abs. 2 und 3 der Norm SIA 118 gelten bei vereinbarten Teilzahlungen (z.B. nach Zahlungsplan) analog. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an die Unternehmung zur Korrektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemässen Zahlungsbegehrens nicht fällig. Das ASTRA behält sich vor, die Schlussrechnung der SBB AG durch die Finanzkontrolle prüfen zu lassen. Die Überprüfung hat innert 12 Monaten ab dem Datum der gemäss SIA Norm 118, Art. 155

geleisteten Zahlung zu erfolgen. Sofern als Folge dieser Überprüfung Differenzen bestehen, ist gemäss Art. 154, Abs. 3 vorzugehen.

14.4. Die Zahlungsfrist beträgt 45 Tage ab Rechnungsstellung.

E. Allgemeine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausführung von sämtlichen Arbeiten (Bauarbeiten, Unterhaltsarbeiten usw.)

15. Ausführung von Arbeiten

15.1. Sämtlichen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauwerk bedürfen eine vorherige Kontaktaufnahme und Koordination mit den zuständigen Fachdiensten der SBB AG (Ansprechstelle: SBB Infrastruktur, Verfügbarkeit & Unterhalt, Überwachung, Region Mitte, Bahnnahes Bauen, E-Mail: x001861@sbb.ch). Die Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher Zustimmung der SBB AG und müssen nach deren Anweisungen ausgeführt werden.

15.2. Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (Gleise, Schotter, Sicherungsanlagen- und Fahrleitungseinrichtungen, Kabelschächte usw.) müssen in jedem Fall durch die Fachdienste der SBB AG selbst oder durch von diesen bezeichneten Fachpersonen, resp. unter deren Aufsicht ausgeführt werden.

16. Sicherheit

16.1. Die Vertragsparteien sind sich der besonderen Gefahren des Bahnbetriebs, namentlich im Zusammenhang mit elektrischen Leitungsanlagen (Fahrleitungen) bewusst. Selbst- und Fremdgefährdungen sowie Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs sind verboten. Die gesetzlichen Grundlagen, die Sicherheitsvorschriften sowie die Weisungen der Transportpolizei und der Bahnaufsichtsorgane sind zu befolgen.

16.2. Der Zutritt zu nicht öffentlichen Arealen der SBB AG ist nur mit vorgängiger Einwilligung erlaubt.

F. Weitere Bestimmungen

17. Haftung

17.1. Jede Partei haftet für alle Schäden, welche durch die von ihr ausgeführten Arbeiten verursacht werden. Umfasst sind sämtliche Arbeiten, welche den Parteien gemäss dieser Vereinbarung obliegen.

17.2. Jede Partei ist bis zur Vollendung des Rückbaus für die Bauwerke verantwortlich, die sich gemäss vorliegender Vereinbarung in ihrem Eigentum befinden.

17.3. Die Vertragsparteien beschränken die gegenseitige Haftung auf Absicht und Grobfahrlässigkeit.

17.4. Werden von einer Drittpartei Ansprüche gegenüber einer der Vertragsparteien erhoben, so hält die im Innenverhältnis haftpflichtige Vertragspartei die andere im Rahmen dieser Haftungsbestimmungen schadlos.

- 17.5. Jede Partei verpflichtet sich, die andere Partei bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter zu unterstützen, insbesondere durch Beibringen von Beweismitteln, die Mitwirkung in einem allfälligen Prozess oder die Vertretung der anderen Partei im Verfahren.

18. Projektabbruch

- 18.1. Im Falle eines zwischen den Vertragsparteien einvernehmlichen Projektabbruchs werden die bis dahin entstandenen Kosten vom ASTRA getragen.
- 18.2. Im Falle eines Projektabbruchs, der infolge einer Nichterteilung der Baugenehmigung erfolgt, werden die bis dahin entstandenen Kosten vom ASTRA getragen.
- 18.3. Die Partei, die den Projektabbruch verursacht hat, trägt die daraus resultierenden Kosten für die Anpassung des Projekts.

19. Geistiges Eigentum

Die von der SBB AG im Rahmen dieser Vereinbarung erstellten Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Die Dokumente und das Know-how, welche die SBB AG dem ASTRA für die Erfüllung dieser Vereinbarung zur Verfügung stellt, dürfen nur im Zusammenhang mit dem betreffenden Projekt verwendet werden. Das ASTRA verpflichtet sich, alle am Projekt beteiligten Dritten zur Einhaltung derselben Verpflichtung anzuhalten. Die SBB AG behält sich vor, gegen jegliche unbefugte Verwertung (wie z.B. Vervielfältigung, Verbreitung) der Dokumente und jegliche sonstigen Verletzungen ihrer Rechte vorzugehen.

20. Äusserungen gegenüber den Medien (inkl. Social Media und Referenzen) und die Verwendung des Logos SBB AG

Für die Medien bestimmte Erklärungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung werden zwischen den Vertragspartnern jeweils vorab abgestimmt. Die Verwendung des Namens und/oder des Logos der SBB AG sowie des ASTRA bzw. des Bundes bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der jeweils anderen Partei. Den Äusserungen gegenüber den Medien gleichgestellt sind öffentlich zugängliche Äusserungen gegenüber Dritten (insbesondere Referenzen).

21. Übermittlung von Kontaktdaten

Wenn Bauvorhaben Dritter im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis eine Koordination zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner erfordern, können die Parteien dem Dritten den Namen und die Kontaktdaten des Partners übermitteln.

22. Übertragung

Die Parteien verpflichten sich, alle in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte und Pflichten – soweit sie noch nicht erfüllt wurden – an allfällige Rechtsnachfolger abzutreten, mit der Verpflichtung zur analogen Übertragung auf alle späteren

Rechtsnachfolger. Die Übertragung muss Gegenstand einer schriftlichen Urkunde sein, die von den Parteien dieser Vereinbarung unterzeichnet wird.

23. Ausschluss der Gründung einer einfachen Gesellschaft

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

24. Schriftform und Inkrafttreten, Änderung

- 24.1. Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung der zuständigen Organe des ASTRA und der SBB AG. Sie tritt mit der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.
- 24.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der Unterschrift aller Parteien.
- 24.3. Die Parteien erkennen an, dass diese Vereinbarung sowie ihre Änderungen und Ergänzungen, die elektronisch mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) und Verordnung über die elektronische Signatur (VZertES) unterzeichnet wurden, die gleiche Rechtskraft haben wie ein handschriftlich unterzeichneter Vertrag und alle gesetzlichen Formerfordernisse erfüllen.

25. Öffentlichkeitsgesetz

Gestützt auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3) ist die Bundesverwaltung verpflichtet, der Öffentlichkeit den Zugang zu amtlichen Dokumenten zu gewährleisten. Die Parteien nehmen davon Kenntnis und akzeptieren, dass der vorliegende Vertrag sowie alle damit verbundenen amtlichen Dokumente der Öffentlichkeit auf Anfrage zugänglich gemacht werden können. Davon ausgenommen sind die im Öffentlichkeitsgesetz aufgeführten Ausnahmetatbestände (insbesondere gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. g. BGÖ).

26. Dauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung gilt mit dem Abschluss der letzten Arbeiten und der Leistung der letzten Zahlung als erfüllt und fällt hernach dahin.

27. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

- 27.1. Soweit möglich, verpflichten sich die Parteien, allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, einvernehmlich durch Verhandlungen beizulegen, bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.
- 27.2. Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.
- 27.3. Für zivilrechtliche Streitigkeiten ist der Gerichtsstand die Stadt Bern.
- 27.4. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

28. Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Das ASTRA und die SBB AG erhalten je ein unterzeichnetes Exemplar.

29. Anhänge

Die Anhänge sind integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung:

Anhang 1: DP Rückbau SBB 15kV Speiseleitung UW Emmenbrücke – SP Ebikon
(Dok.-Nr. BYLU-DP-TP5-0018-BER-D-0-A8_DP_SBB_FL-TB)
Version 1.3 vom 23.06.2025

Olten,
Für die SBB:

Denise Egli
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Leiterin Perimeter Zentralschweiz

Antonino Cartillone
Lifecycle Manager Fahrstrom Region Mitte

Zofingen,
Für das ASTRA:

Thomas Kloth
Bereichsleiter PM Mitte

René Schnüriger
Projektleiter BSA
